

作業完了報告


作業実施項目	久留米市内アパート 給水管漏水調査・修理
作業内容	給水管交換（塩ビ管）（工期2日）
コメント	給水管の漏水は水道代が高くなって気づく事もありますが、埋設部ではその場所を特定するのは難しく、漏水調査は知識と経験が必要です。 こちらのアパートでは玄関前のモルタルに埋設している給水管（塩ビ管）が破損していました。破損部をモルタルを研って確認後、新しい管に交換し、埋め戻しの作業を実施しました。

漏水調査（漏水箇所特定）



給水管破損部確認

モルタル 研り

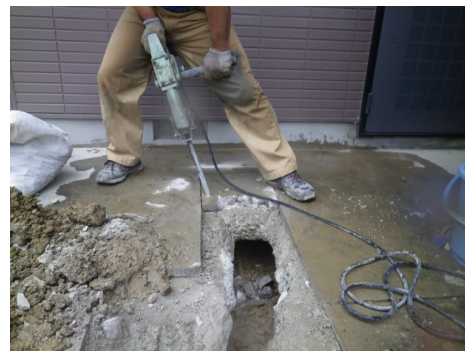

交換作業中



交換作業中



モルタル仕上げ

