

## 作業完了報告

作業実施項目	久留米市内マンション 増圧ポンプ修理
作業内容	給水管交換（鋼管） （作業時間 4時間）
コメント	<p>近年集合住宅では、貯水槽にいったん水を貯め置きすることなく水道水をポンプで増圧し、各住戸に供給する「直結給水方式」の建物が増えてきています。水道水を全戸に供給する大事な心臓部であるポンプですが、これが故障となると一大事です。</p> <p>本件では、ポンプ室での水漏れ報告を受けて急行。放っておくと、制御盤まで水が飛散し電気系統の故障となれば長時間の給水停止を余儀なくされます。幸い軽微な部品交換（メカニカルシール交換）で漏水は改善。メーカーに来てもらうと時間がかかりますが、当社ではポンプの分解点検やパーツ交換もその場で対応可能です。</p>

増 圧 ポ ン プ




ポ ン プ 分 解



ポ ン プ 分 解



交 換 作 業 中

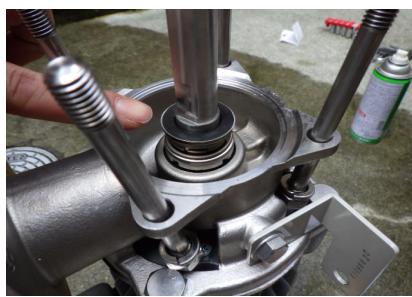

交 換 後 設 置

修 理 完 了

